

Proctorversuch nach DIN 18 127 - P 100Y

Baugebiet Horstfeld in Ostenland
Stadt Delbrück

Bearbeiter: Hr. Nettesheim

Datum: 07.04.2017


Prüfungsnummer: 17 - 6782 - 002-003

Entnahmestelle : P 12.3 + 12.4

Entnahmetiefe : 0,7 - 2,6 m

Bodenart : Ton

Entnahmedatum : 20. u. 21.03.2017

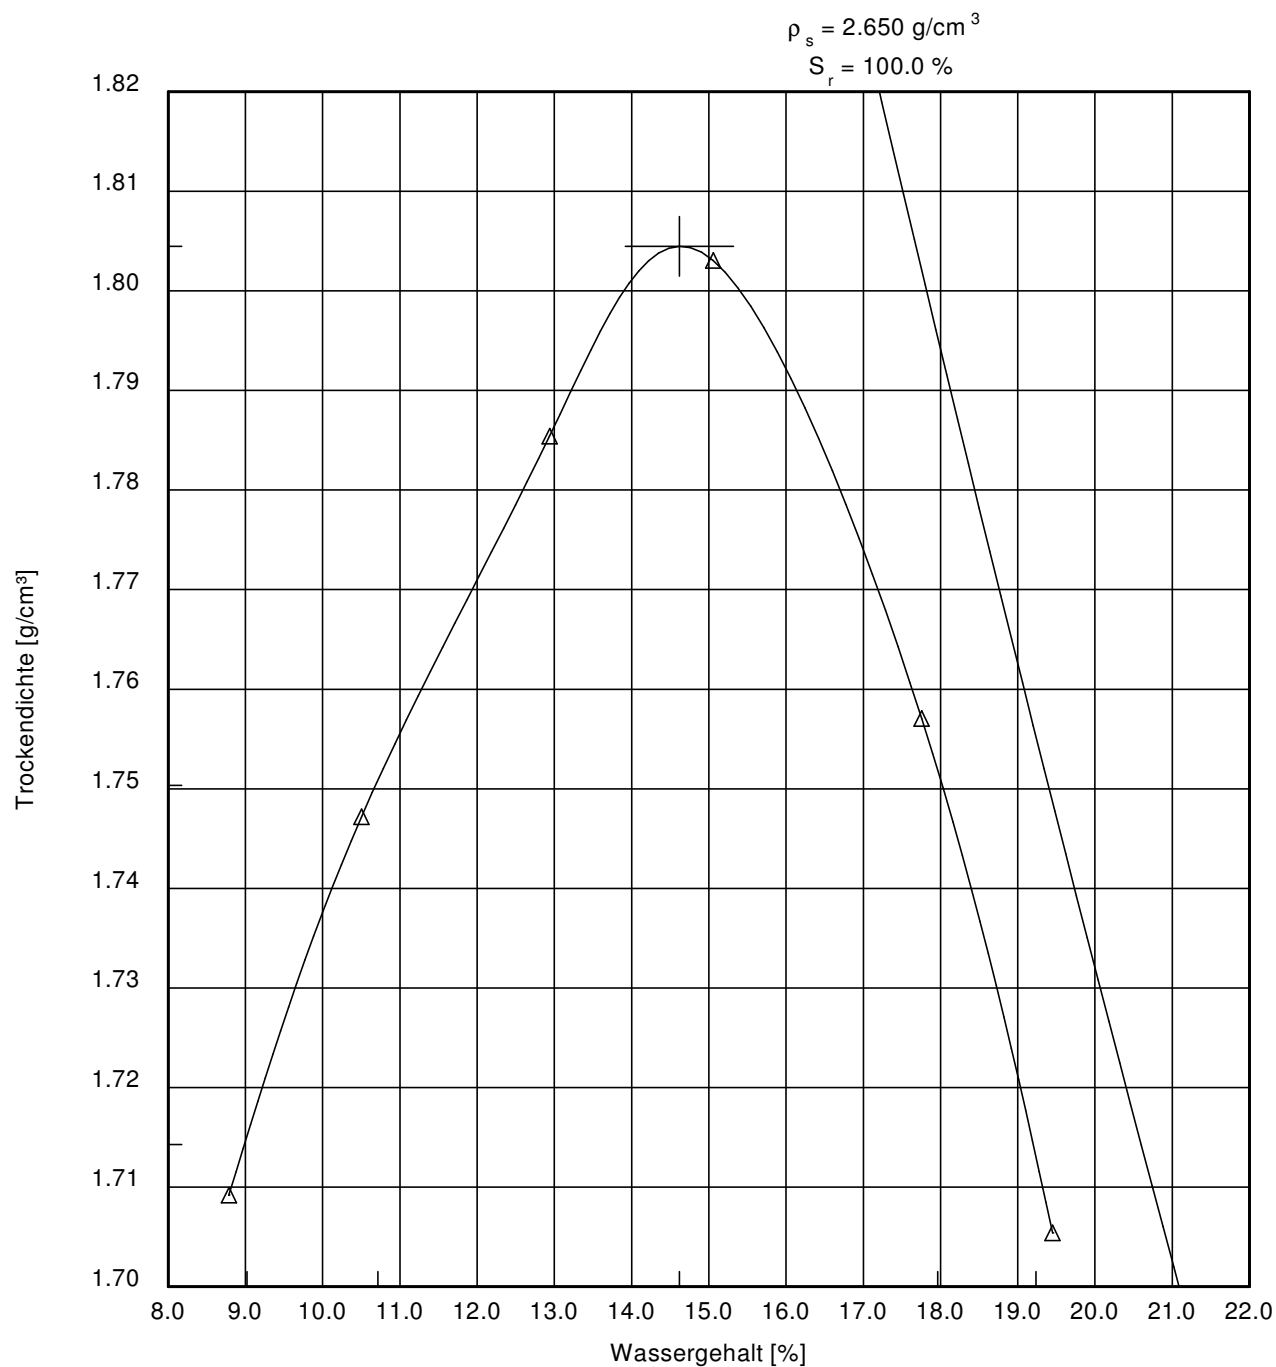

100 % der Proctordichte $\rho_{pr} = 1.804 \text{ g/cm}^3$

Optimaler Wassergehalt $w_{pr} = 14.6 \%$

97.0 % der Proctordichte $\rho_d = 1.750 \text{ g/cm}^3$

min/max Wassergehalt $w = 10.7 / 18.0 \%$

95.0 % der Proctordichte $\rho_d = 1.714 \text{ g/cm}^3$

min/max Wassergehalt $w = 9.0 / 19.2 \%$

Proctorversuch nach DIN 18 127 - P 100 Y

Baugebiet Horstfeld in Ostenland
Stadt Delbrück

Bearbeiter: Hr. Nettesheim

Datum: 07.04.2017


Prüfungsnummer: 17 - 6782 - 005-006

Entnahmestelle : P 21.4 + 21.5

Entnahmetiefe : 1,2 - 3,3 m

Bodenart : Ton

Entnahmedatum : 20. u. 21.03.2017

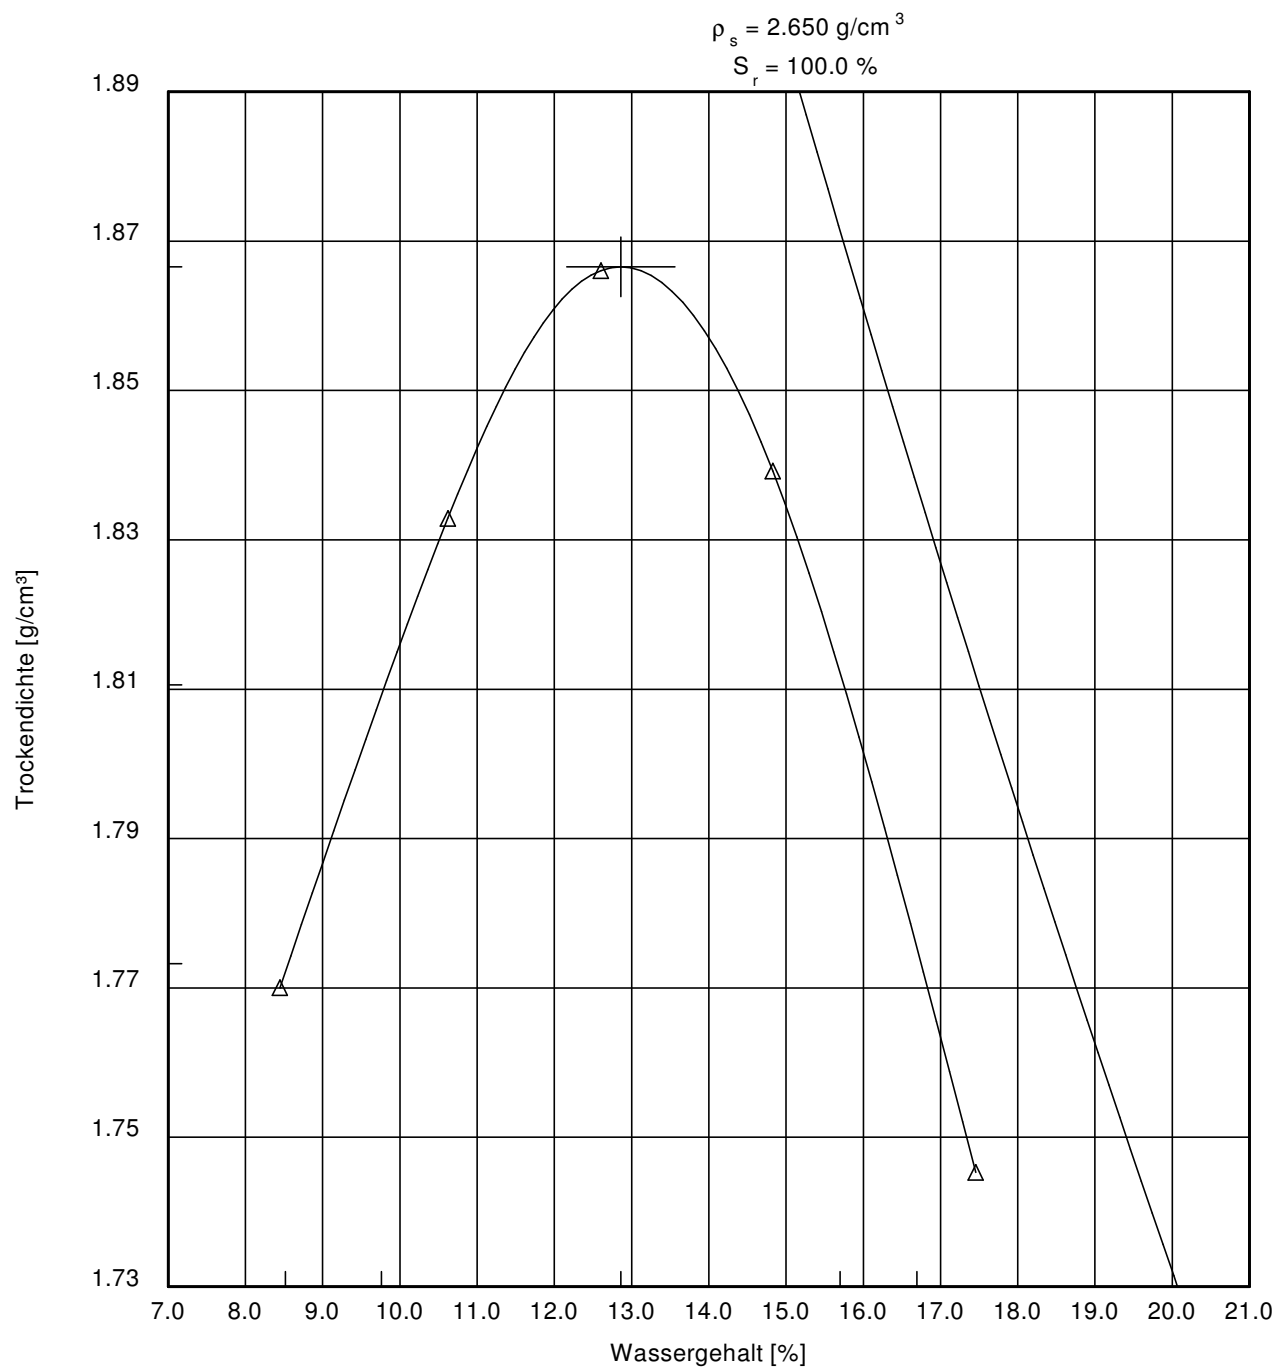

100 % der Proctordichte $\rho_{pr} = 1.867 \text{ g/cm}^3$

Optimaler Wassergehalt $w_{pr} = 12.9 \%$

97.0 % der Proctordichte $\rho_d = 1.811 \text{ g/cm}^3$

min/max Wassergehalt $w = 9.8 / 15.7 \%$

95.0 % der Proctordichte $\rho_d = 1.773 \text{ g/cm}^3$

min/max Wassergehalt $w = 8.5 / 16.7 \%$
