

Kernbohrung 6


Schichtenverzeichnis

(GOK: 121,91 m NN)

	0,50 m	A		0,50 m / SCHLUFF; humos / künstliche Auffüllung / dunkelbraun, schwarz, rot, bunt / Ziegelreste
120,91 m	0,80 m	A		0,30 m / SCHLUFF; humos, sandig, tonig / künstliche Auffüllung / dunkelbraun / Ziegelreste
119,91 m	1,80 m	A		1,00 m / SCHLUFF; sandig, schwach tonig- tonig / künstliche Auffüllung / graubraun
118,91 m	3,00 m	Z		0,20 m / KALKMERGELSTEIN; tonig, steinig / graubraun / stark verwittert
117,91 m	4,00 m	Z		1,00 m / KALKMERGELSTEIN; tonig, steinig / graubraun / stark verwittert
116,91 m	4,50 m	Z		1,00 m / KALKMERGELSTEIN; tonig, steinig / graubraun / stark verwittert
115,91 m	6,00 m	Z		0,50 m / KALKMERGELSTEIN
114,91 m	6,30 m	Z		1,50 m / KALKMERGELSTEIN
113,91 m	7,50 m	Z		0,30 m / KALKMERGELSTEIN; Kluft
112,91 m	8,20 m	Z		1,20 m / KALKMERGELSTEIN
111,91 m	8,50 m	Z		0,70 m / KALKMERGELSTEIN
110,91 m	8,80 m	Z		0,30 m / KALKMERGELSTEIN
109,91 m	9,00 m	Z		0,50 m / MERGELKALKSTEIN; braungrau
108,91 m	10,30 m	Z		1,30 m / MERGELKALKSTEIN
107,91 m	10,55 m	Z		0,25 m / Kernverlust
106,91 m	11,05 m	Z		0,50 m / MERGELKALKSTEIN; braungrau
105,91 m	11,60 m	Z		0,55 m / MERGELKALKSTEIN
104,91 m	12,40 m	Z		0,80 m / MERGELKALKSTEIN
103,91 m	13,20 m	Z		0,80 m / MERGELKALKSTEIN; grau
102,91 m	13,30 m	Z		0,10 m / Kernverlust
101,91 m	13,65 m	Z		0,35 m / MERGELKALKSTEIN; grau
100,91 m	13,90 m	Z		0,25 m / MERGELKALKSTEIN; grau
99,91 m	15,00 m	Z		1,10 m / MERGELKALKSTEIN; dunkelgrau / Kluft bei 14,80m
98,91 m	15,30 m	Z		0,30 m / MERGELKALKSTEIN; braungrau
97,91 m	15,50 m	Z		0,20 m / MERGELKALKSTEIN; braungrau / Kluft 70°
96,91 m	17,70 m	Z		2,20 m / MERGELKALKSTEIN; grau / Kluft bei 17, 70m
95,91 m	18,10 m	Z		0,40 m / MERGELKALKSTEIN; braungrau / kluftig
94,91 m	21,80 m	Z		2,00 m / MERGELKALKSTEIN; grau
93,91 m	22,10 m	Z		0,30 m / MERGELKALKSTEIN; grau
92,91 m	22,20 m	Z		0,10 m / MERGELKALKSTEIN; grau
91,91 m	22,40 m	Z		0,20 m / MERGELKALKSTEIN; grau
90,91 m	22,80 m	Z		0,40 m / MERGELKALKSTEIN; braungrau / Kluft
89,91 m	23,70 m	Z		0,90 m / MERGELKALKSTEIN; grau
88,91 m	24,15 m	Z		0,45 m / MERGELKALKSTEIN; braungrau / Kluft
87,91 m	24,50 m	Z		0,35 m / MERGELKALKSTEIN; grau / Kluft
86,91 m	25,00 m	Z		0,50 m / MERGELKALKSTEIN; braungrau / Kluft


Klüftung*
(Zerlegungsgrad*)

gering stark

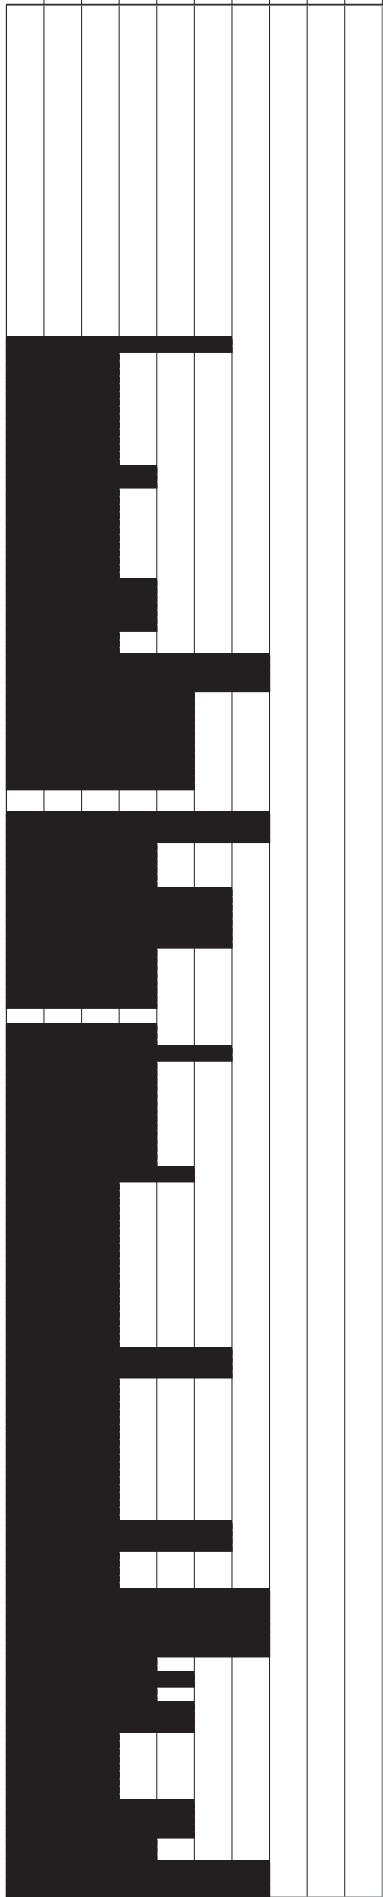


Verwitterungsgrad*


gering hoch

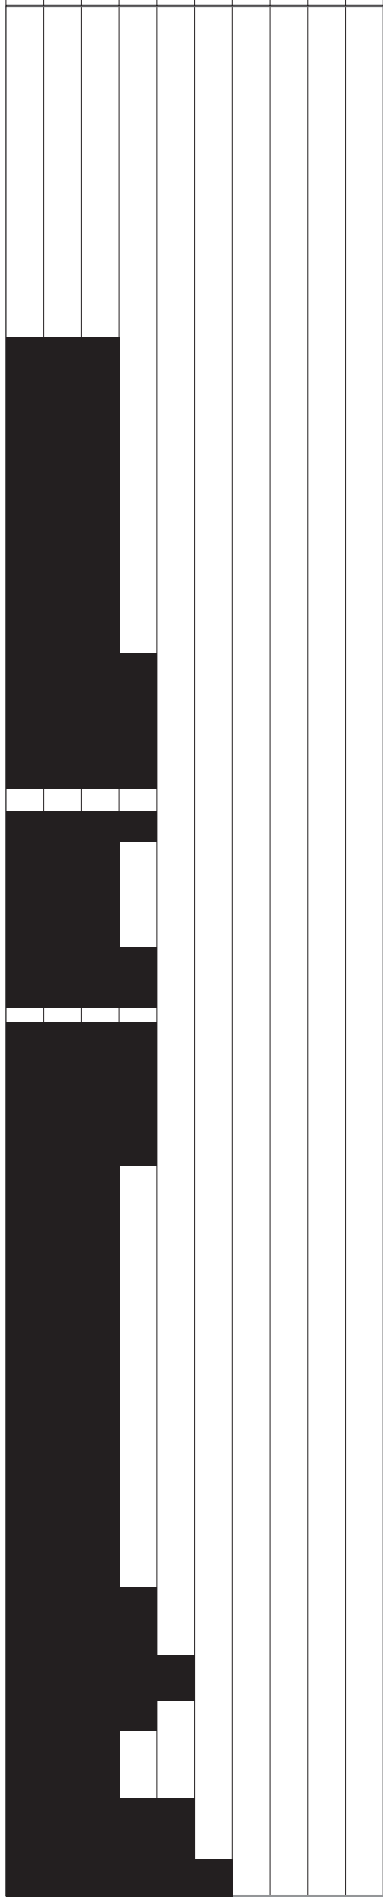**Gesteinsfestigkeit***

gering hoch

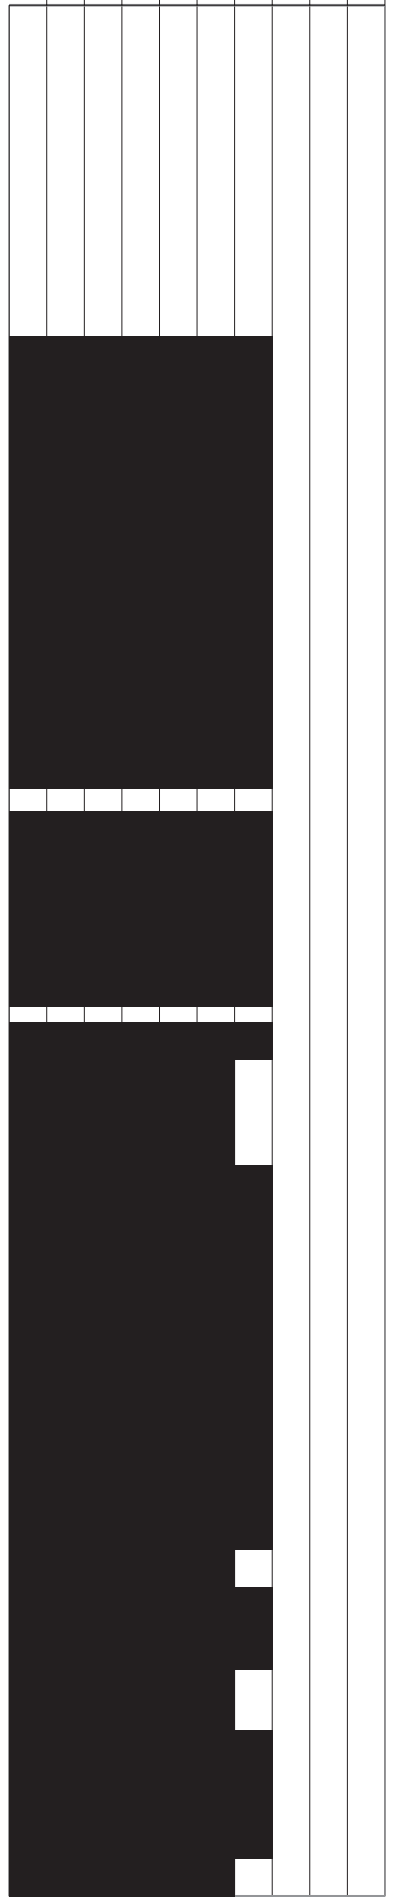

Fotodokumentation:

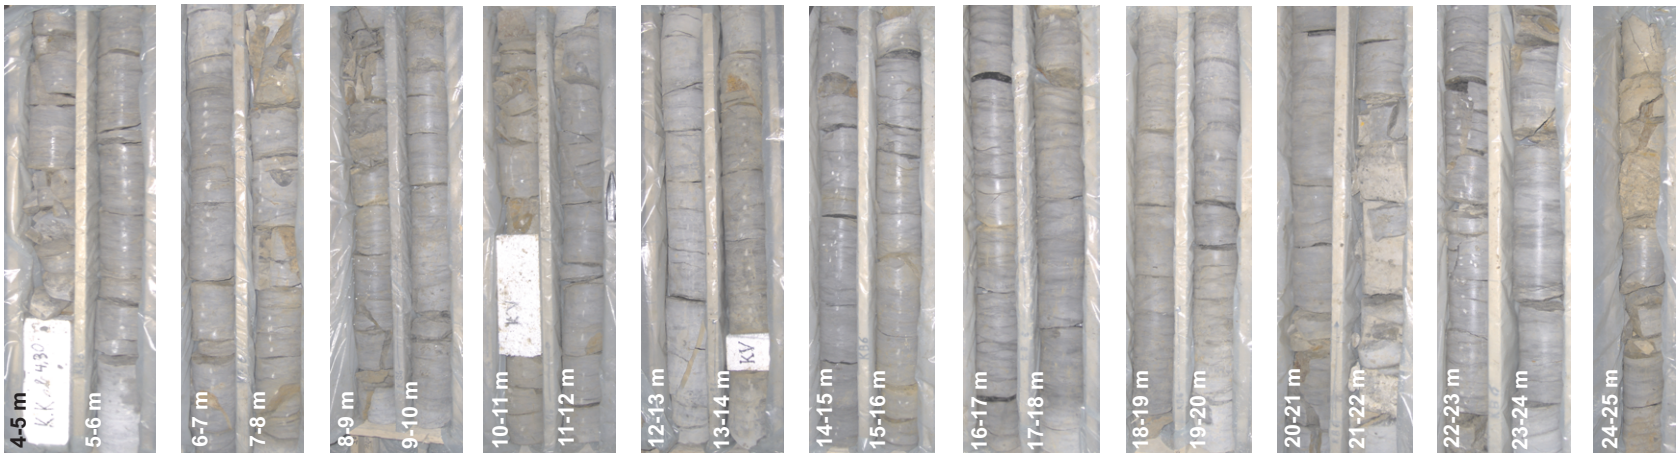

Kernbohrung 6

Proj.-Nr.: 2136

* Die Klassifikation erfolgte anhand einer subjektiven Bewertungsskala von 1 (gering) bis 5 (stark/hoch)

Ort d. Bohrg. : Paderborn - Kötterhagen

Anlage:

Auftraggeber : Volksbank-Paderborn-Höxter

Seite: 1 von 1

Bohrfirma : Stuckmann Brunnenbau GmbH & Co.KG

Maßstab: 1:100

Bearbeiter : TJ

Datum: 09.03.2006

SCHMIDT UND PARTNER |

Beratende Hydrogeologen BDG
Beratende Ingenieure VBI



Dipl.-Geol. Frank Schmidt • Beratende Hydrogeologen BDG • Beratende Ingenieure VBI
Osnungstraße 75 • 33605 Bielefeld
Telefon: 0 52 1/ 950 399 0 • Telefax: 0 52 1/ 950 399 19
E-mail: kontakt@schydro.de • Internet: www.schydro.de
Bankverbindung: Sparkasse Bielefeld • Konto-Nr. 64 53 153 • BLZ 480 501 61
